



CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

CNPJ: 47.599.766/0001-06 – e mail: ceinsffartura@yahoo.com.br

Rua Santa Bernadete, 171 VI de Fátima Fone 14 3382 1327 CEP 18873-114 FARTURA-SP

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

| | | | |
|-------|---------------------|------------|---------------|
| Termo | 11-M/2022 - REFORMA | Referência | SETEMBRO/2022 |
|-------|---------------------|------------|---------------|

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Neste mês de setembro, dado continuidade a reforma, apesar das chuvas constantes foram realizadas as etapas, conforme a planilha e cronograma.

Segue o Laudo de Acompanhamento de andamento da obra, elaborado pelo engenheiro responsável e as fotos em anexo.

Fartura, 30 de setembro de 2022.



José Antônio Correa Custódio
Presidente

“PROFAR – PROJETOS, PLANEJAMENTOS E ASSISTÊNCIA AGRO-PECUARIA LTDA – ME”

Rua Belgrave Teixeira de Carvalho, nº 467 – Vila Nova – Fartura/SP
CNPJ: 66.491.309/0001-30 IE: Isento IM:74/93 FONE: (14)9-97880177

LAUDO PARA ACOMPANHAMENTO DE ANDAMENTO DE OBRA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL

FARTURA, 30 DE SETEMBRO DE 2022




A
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

Declaro para os devidos fins, que a obra se encontra com andamento normal, conforme o previsto em cronogramas e planilhas.

Seguem os itens já executados:

- Abertura de valetas e brocas;
- Execução de brocas em concreto armado;
- Execução de vigas baldrame em concreto armado;
- Reboco das vigas com impermeabilizante e neutrol;
- Execução de Alvenaria de Fechamento dos ambientes propostos em projeto;
- Execução de Pilares;
- Execução de Vergas e Contra Vergas de portas e janelas;
- Execução de Cintas em Concreto armado no perímetro dos ambientes.

Execução de itens conforme relatório fotográfico.

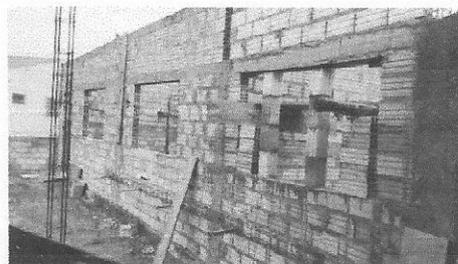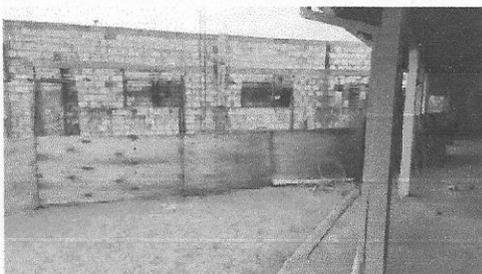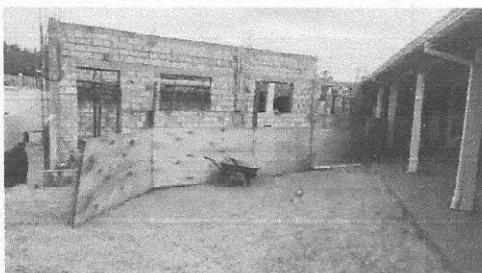


**“PROFAR – PROJETOS, PLANEJAMENTOS E ASSISTÊNCIA AGRO-PECUARIA
LTDA – ME”**

Rua Belgrave Teixeira de Carvalho, nº 467 – Vila Nova – Fartura/SP
CNPJ: 66.491.309/0001-30 IE: Isento IM:74/93 FONE: (14)9-97880177

Declaro ainda para os devidos fins, que a obra se encontra com 50% (cinquenta por cento) já executada, referente ao orçamento proposto. Faltando somente a execução de cobertura, reboco interno e externo e forro.

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.
Atenciosamente,



Engº Paulo Roberto Lucareli
Crea: 0600550303
